Salten Brann IKS

Styret – Salten Brann IKS

Sak nr. 48 - 2020 3. september 2020

# REVIDERT TIDSPLAN FOR ARBEIDSPROSESS VEDRØRENDE NY BRANNORDNING

Vedlegg A: Tidsplan, versjon 1

Vedlegg B: Tidsplan, versjon 2

## Innledning

Det vises til sak 40/20 som ble behandlet i styremøtet den 20. august. Der ble status i sakene om ny brannordning lagt fram for styret. Denne saken omhandler behovet for og forslag til ny framdriftsplan for revidering av brannordning.

## Drøfting

Selskapet mener at den opprinnelige tidsplanen må revideres da den opprinnelige fram-driftsplanen med å avholde kommunevise møter ikke lar seg gjennomføre. I skrivende stund så er møtene med Værøy og Bodø kommune ikke avklarte. Selskapet antar at møtene vil kunne være gjennomført før utgangen av september.

Til styremøtet den 8. sep 2020 så ble det opprinnelig planlagt å avsette tid til både en strategisamling samt et ordinært styremøte etterpå, jfr møteplan og hvor saken om ny brannordning skulle behandles første gang av styret. Nedenfor vises den opprinnelige planen.

1. Kl 1000 – kl 1500, strategisamling
2. Kl 1500 – kl 1800, styremøte
3. Fokus strategisamling:
    a. Første gangs behandling av brannordninger
    b. Drøfte økonomiske konsekvenser
    c. Presentasjon av alternative finansieringsmodeller for selskapsavtalens § 7 (finansiering).

Slik situasjonen nå foreligger så vil sakene vedrørende ny brannordning og forslag til ny finansiering kun bli drøftet på strategiseminaret. Det betyr at tidsplanen for arbeidet som gjenstår må revideres. I Korte trekk betyr dette at første gangs behandling av disse to sakene vil bli lagt fram for behandling 12. oktober, når alle kommunale møter er gjennomført. Deretter

holder vi en statusorientering til rep skapet 6. november samtidig med at budsjettsaken behandles for år 2021. Der framlegger vi selskapets foreløpige plan med mulige problem-stillinger. Her vil saken om finansiering ha stor betydning. Det kan være at den kan slutt-behandles på dette møtet, men det bør styret vurdere.

Deretter mener selskapet at styret sluttbehandler saken medio januar 2021 med påfølgende ekstraordinært rep skap medio februar 2021. På denne måten rekker kommunene å ha tilstrekkelig tid til å behandle saken internt før sluttbehandlingen i rep skapet.

Det er viktig å understreke at kommunene må fatte kommunale vedtak i etterkant vedrørende egen brannordning, men før gjennomføringen av vårens rep skap i mai 2021. I dette møtet må selskapet presentere status for alle vedtak som skal være gjennomført slik at rep skapet ser at alle formaliteter fra eierkommunene er på plass før en implementering kan starte. Dette gjelder selvsagt også saken om endring av bestemmelsene for selskapets finansiering som finnes i selskapsavtalens § 7.

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til revidert framdriftsplan.*
2. *Selskapet orienterer eierkommunene om vedtaket.*

Hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og brannsjef
Salten Brann IKS

Vedlegg 1, Opprinnelig tidsplan

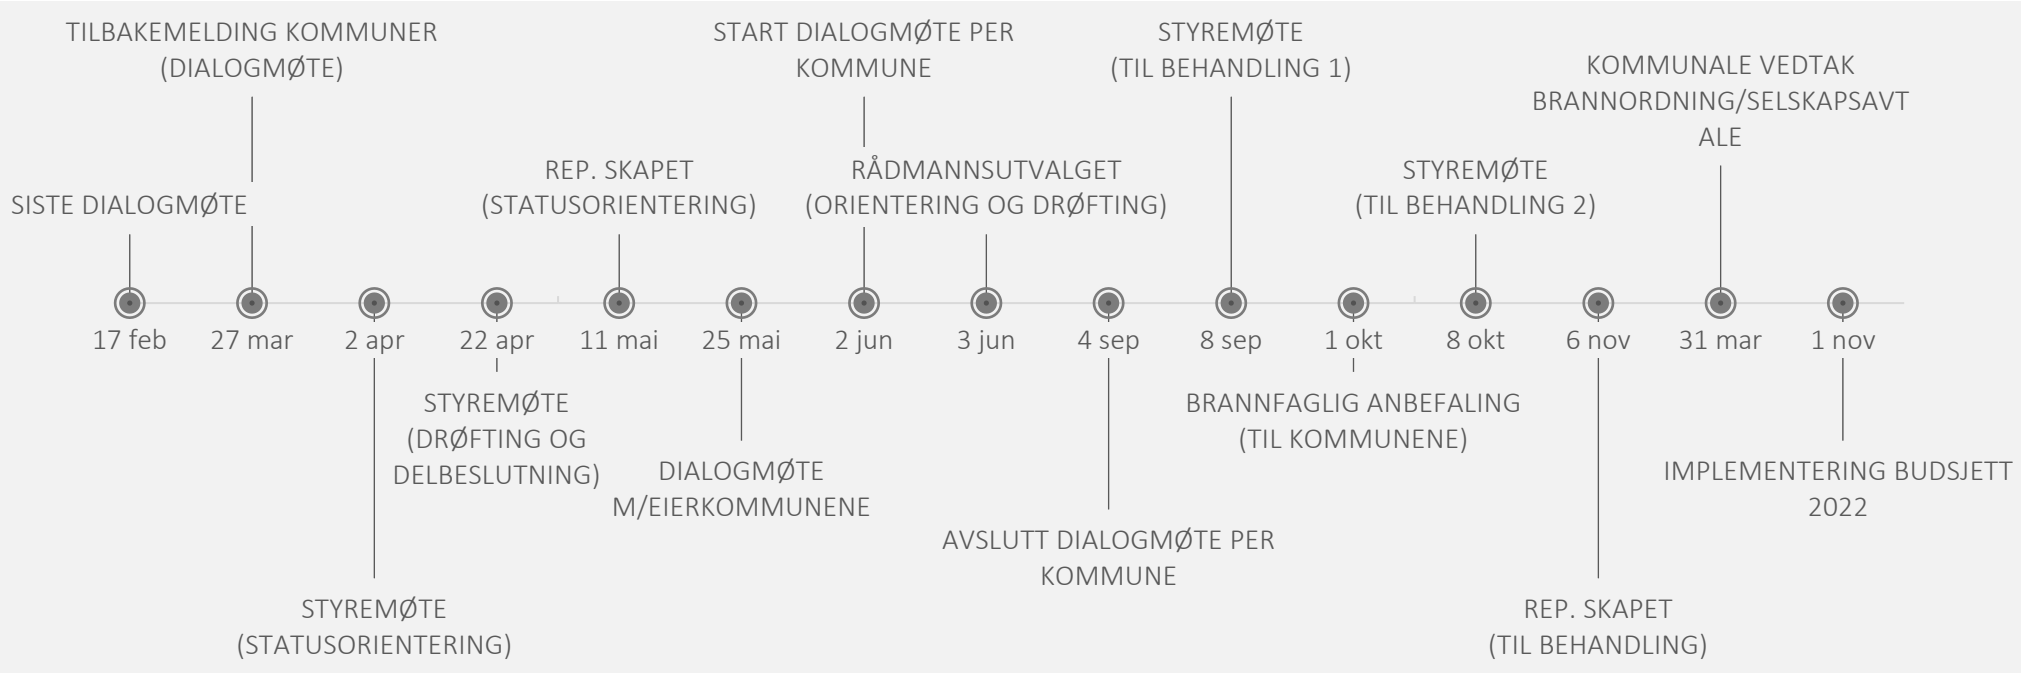
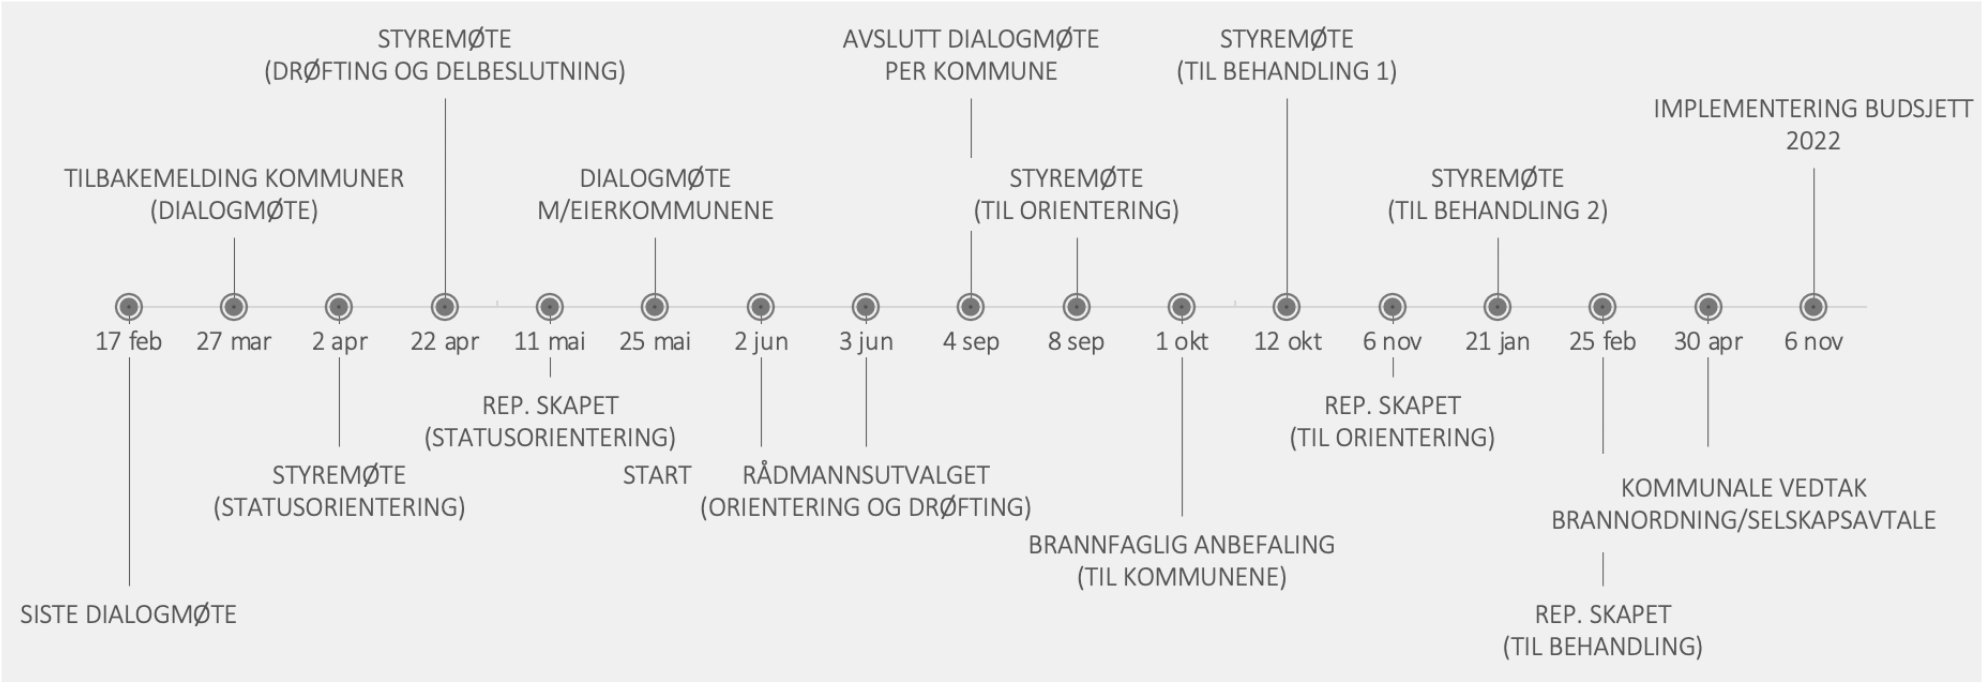
Vedlegg 2, Revidert tidsplan
